

# Projektinformation

## Värmepumpsinstallation Panncentralen Frölundaborg

Borrarbetena har nu kommit igång på Marklandsgatan 51-57 (borrområde A). För tillfället pågår jordborring med nedförning av så kallade foderrör ned till berg. Större bergbormaskiner kommer sedan ta vid för att borra sig ned i berget till ett totaldjup av 300 m. Med start vecka 38 kommer grävning av ledningsschakt ske för de köldbärarledningar som ansluter borrhålen till panncentralen. Grävning är tänkt att ske från borrområde A och gå mot panncentralen. Gångvägen vid borrområde B kommer att vara avspärrad. Vid övriga passager läggs körplåtar ut och ledningsschakten omgärdas av staket.


I panncentralen kommer huvudsakligen rivningar av oljepannor, rökgasfläktar, ledningar och annan äldre utrustning att ske.

### Vecka 38

- Borrning energibrunnar
- Utrivning av oljepannor och äldre utrustning
- Start grävning för köldbärarkulvert

### Vecka 39

- Borrning energibrunnar
- Utrivning av oljepannor och äldre utrustning
- Grävning för köldbärarkulvert
- Start läggning av köldbärarledningar

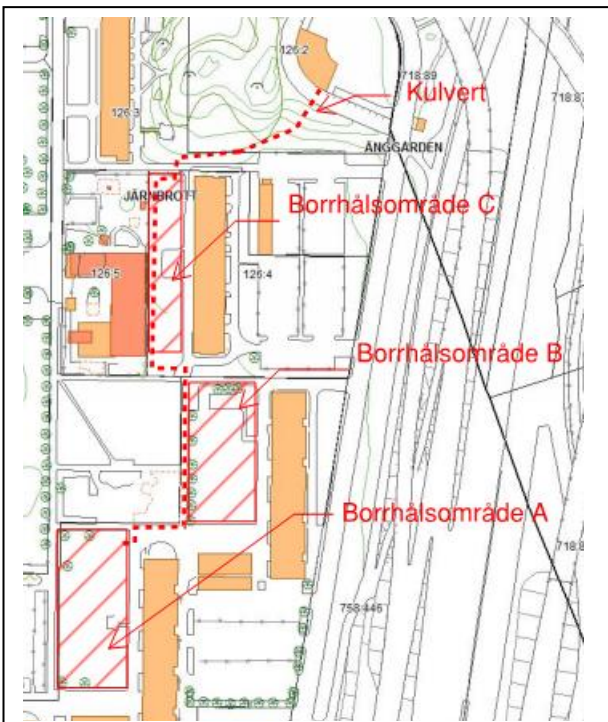

Bergbormaskin under borring med foderrör
